


1. ACTUALIZAÇÃO SOBRE LACUNCAS E NECESSIDADES APÓS AS CHUVAS E CHEIAS DE JANEIRO 2020	Acção	Responsável
<p>Ao aproximar-se da fase de pico da época chuvosa (fevereiro), é importante que se coordene com o INGC na colecta de dados de pessoas impactadas pela chuvas e cheias.</p> 	<p>Colecta de dados em ligação com o INGC</p>	<p>IOM-DTM Eva SC</p>
<p>Actualizações Linha verde: Maior parte dos casos têm sido reportados fora dos dos bairros de reassentamento. Novos pedidos, especialmente da Beira e do Dondo, após as fortes chuvas das últimas semanas</p>	<p>Suporte necessário em casos com maior recorrência</p>	<p>Gerson SC</p>
<p>4W: todos os parceiros SC são convidados a actualizar os 4W</p>		
2. ACTUALIZAÇÃO SOBRE O PLANO DE CONTINGÊNCIA	Acção	Responsável
<p>Colecta de dados para estoque disponível de Abrigo e Artigos Não Alimentares em andamento. Todos os parceiros são convidados a partilhar dados de estoque disponível e respectiva localização.</p>	<p>Por partilhar estoque Por finalizar estoque</p>	<p>Parceiros SC Eva SC</p>
<p>Será partilhado entre os parceiros SC o Plano de Contingência</p>	<p>Por partilhar</p>	<p>INGC / SC</p>
3. ACTUALIZAÇÃO DOS PARCEIROS EM ABRIGO	Acção	Responsável
<p>GREPOC O novo escritório na cidade da Beira está localizado na Rua Dom Francisco Gorião (GPS: -19.847794°/ 34.851382°) O processo de recrutamento da equipe técnica do GREPOC está em andamento Workshop: "Seminário Técnico de Preparação do Plano de Acção de Recuperação da Habitação" - Maputo - 26/27 de fevereiro de 2020</p>	<p>Estruturação em curso Confirmar datas</p>	<p>GREPOC GREPOC UN-Hab</p>
<p>ALLIANCE 2015 Abrigo: Concluída a aquisição de materiais (10 chapas 0,3 mm) Treinamentos em Abrigo: em curso planos para o treinamento. Latrinas: distribuição em curso (4 chapas 0,3 mm)</p>	<p>Por confirmar plano de treinamento</p>	<p>A2015</p>
<p>APOIAR Concluída a construção de 58 casas. Já iniciada actividades de WASH. Trabalhando também em reparação de escolas, construção de cozinhas escolares, e centros de saúde. Visita de campo ao projecto concluído a 4 de fevereiro pela UN-Hab e SC</p>	<p>Por confirmar especificações técnicas, desenho.</p>	<p>APOIAR</p>
<p>CARE Reparação de abrigos: em curso distribuição de 18.000 kits (6 chapas 0,4mm)</p>	<p>Actualização da distribuição</p>	<p>CARE</p>

em Búzi. Aproximadamente 6.000 distribuídos. Kits são distribuídos à famílias fora dos bairros de reassentamento. Construção de abrigo resiliente: por iniciar com um total de 540 unidades.		
CEDES: 5.000 conjunto de cozinha prontos para a distribuição Plano de construção de 500 casas em Nhamatanda, Buzi e Beira area urbana	Por partilhar plano de distribuição	CEDES
CARITAS/CRS Em curso construção de 5 casas piloto em Tica. Avaliação de projectos em Manica e Sofala serão feitos depois da conclusão das casas pilotos em 2 províncias. Revisão técnica (dezembro 2019): Encontro para revisão de pontos técnicos	Discussão da revisão técnica	CRS / SC
IFRC Abrigo: Concluída a construção de 15 casas resilientes/transição. Em curso construção de 55 abrigos. Plano de construção de aproximadamente 150 abrigos resilientes/transição (por confirmar). Casas Permanentes: em curso plano de seleção de bairros urbanos em Beira para inicio do novo projecto.	Planos por partilhar	IFRC
OIT Por começar 5 locais de produção de blocos de solo-cimento em Dondo, Caia, Nhamatanda, Beira, Buzi. Em curso a organização do treinamento para produção de blocos de solo-cimento.	Por partilhar plano Por partilhar datas	OIT OIT
OIM Abrigos de Transição/Resiliente: Plano de construção de 287 unidades em Nhamatanda. Abrigos de emergência: Plano de distribuição de aproximadamente 1.000 kits em Nhamatanda. Highlighted needs in the resettlement camp Mudhala (S19.979° E33.589°), in Chibabava District but only accessible via Dombe	Por partilhar desenho Visita de campo em Mudhala planeada para 12 de fevereiro	OIM Lucio SC
LIGHT FOR THE WORLD Advogar pela inclusão de medidas de acessibilidade nas casas. Poderia providenciar suporte técnico aos parceiros.		
UNDP/YOUNG AFRICA Em curso a construção de 40 casas com suporte da Young Africa Em curso revisão do plano 2020-2021	Por partilhar especificações técnicas, desenho, quantidades	UNDP/Young Africa
UN-HABITAT Começou com a construção de 4 casas piloto (2 construções + 2 reparações) em Dondo. Em curso desenvolvimento da tipologia da Casa Evolutiva. Partilhados mapas actualizados dos danos ocorridos em Beira.	Por partilhar especificações técnicas, desenho, quant. Materiais para as casas.	UN Habitat
4. ABRIGO DE EMERGÊNCIA IEC (INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO) + NECESSIDADES DE TREINAMENTO		
O SC procura compreender melhor o potencial do IEC e a necessidade de treinamento para intervenções de emergência.		SC
Diversos parceiros em abrigo estão a trabalhar nos treinamentos de beneficiários, artesãos, voluntários, trabalhando por vezes com organizações especializadas (Young Africa, por exemplo). SC irá começar a colectar informação sobre diferentes modalidades de treinamento a fim de reunir melhores práticas.	Por partilhar informação sobre módulos e modalidades de treinamento.	Parceiros SC
5. PRÓXIMO ENCONTRO DE COORDENAÇÃO:		
Próximo encontro: Segunda-feira 24 fev. – 14:00h - DPOPHRH or GREPOC Beira (por confirmar)		

	LOCATION	People	HH	2020								STATUS	REMARKS	
				Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug			
ALLIANCE2015	Nhamatanda	25'000	5'000										Abrigo concluído WASH: em curso Treinam.: por começar	4.A - SHELTER UPGRADE - Tradicional Shelter: concluído. 10 chapas Latrinas: distribuição de 4 chapas 0,3mm
APOIAR	Dondo	300	60										Concluído	Começando actividades de WASH Trabalhando em instalações de escolas e saúde Artigos Não Alimentares: melhorias na promoção de fogões em escolas
AVSI	Por Confirmar	Por Confirmar	Por Confirmar										Concluído	4.A - SHELTER UPGRADE - Tradicional Training in collaboration with DPOPHRH
CARE / COSACA	Buzi	2'700	540										Maio 2020	3- RESILIENT / TRANSITIONAL SHELTER Reinforced Pau-a-Pique Rural /Urban intervention strategy under finalization
CARE / COSACA	Buzi	90'000	18'000										Março - Abril 2020	4.A - SHELTER UPGRADE - Tradicional Distribution of Shelter kits: 6 chapas/family + Tool kits Chapas = 0,4 mm
Ministerio de Gracia	Buzi	300	100										Fev 2020	2- EMERGENCY SHELTER UPGRADE 12m2 shelters of timber structure with 20 chapas
CEDES	Buzi, Nhamatanda, Beira	2500	500										Por confirmar	3- RESILIENT / TRANSITIONAL SHELTER Details to be confirmed Fired bricks + CGI sheet
Soul Frater	Buzi	25	5										Por confirmar	5- CORE HOUSE (CASA EVOLUTIVA) Ongoing construction of 5 houses (min. 20m2)
IFRC	Dondo (Chinamacondo)	750	150										Plan under review 03/2021	3- RESILIENT / TRANSITIONAL SHELTER traditional materials Started construction of 50 units. Plan under review
IFRC	Beira urban areas												Plan under review 03/2021	5- CORE HOUSE (Casa Evolutiva) Ongoing plan review to start construction of houses in urban areas
IOM	Sofala: Dondo, Buzi Manica: TBC	20,000	4,000										Por confirmar	2- EMERGENCY SHELTER UPGRADE Distribution of tarps, toolkits, and materials in resettlement camps Structure: 6 wooden sticks (Estacas) + 20 bamboos
UN-Habitat	Dondo												Por confirmar	To start experimental projects
CRS / CARITAS	Tica (Nhamatanda)	525	105										Por confirmar	5- CORE HOUSE (Casa Evolutiva) Ongoing construction of 15 pilot houses House: adobe blocks Roof: IBR 0,4 mm
UNDP	Chibabava	200	40										Fev / Março 2020	5- CORE HOUSE Construction of 40 houses Training to carpenters with the support of Young Africa
UN Habitat	Dondo	20	4											To start Construction of 4 pilot houses (2 Core houses + 2 House reparation)

Name	Organization	Role	Number	Mail
Manuel FOBRA	DPOPHRH – Sofala	Director Provincial	+258 84 065 9600	mfobra63@yahoo.com
Luis SUTHO	DPOPHRH – Sofala	Chefe de departamento	+258 848486051 +258 823861980	lssuthols25@gmail.com
Clésio BAPTISTA	DPOPHRH - Sofala	Tecnico	+258 844232664	clesio.baptista@yahoo.com.br
Carlito NHAMA	GREPOC	Arquitecto	+258 843040910	cdnhama@yahoo.com.br
Wacela MACAMO	UN Habitat	Arquiteto / Urbanista	+258 84 762 2964	wacela.macamo@un.org
Eva DA COSTA	Shelter Cluster	IM	+258 86 618 0021	moz.im@sheltercluster.org
Gerson SIBINDE	Shelter Cluster	Coord. Assistant	+258 842246649	moz.coord.assistant@sheltercluster.org
Lucio COCCONI	SHELTER CLUSTER	Roaming/Tech Coordinator	+258 844511893	moz.tech1@sheltercluster.org
Momade PADAMA	Alliance 2015 / CESVI	Supervisor de Construção	+258 84 956 6322 +258 87 661 2897	momadepadama7@gmail.com
Karen UACHIÇO	IOM	Operation Assistant	+258 87 078 2642 +258 84 578 2642	hcamalizene@iom.int
Patricia OCANA	IOM	Shelter Program Officer	+258 85 513 3390	pocana@iom.int
Dipti HINGORANI	IFRC	Regional Shelter Coordinator	+258 878682019	dipti.hingorani@ifrc.org
Fabio BORBA	CARE	Construction / Shelter P.M	+258 84 042 1799	fabio.borba@care.org
Mariana BUTTES	CARE	Coord BBS Shelter	+258 847186517	arq.marianab@gmail.com
Zvikomborero SHARIWA	YOUNG AFRICA	Project Coordinator	+258 87 841 5155	shariwa.zvikomborero@youngafrica.org
Edvaldo VASCO	Light For The World	Oficial de Reconstrução	+258 82 160 0030 +258 84 227 7370	e.vasco@light-for-the-world.org
Moisés ANIBAL	Care For Life	DAF	+258 84 398 4512	mjanibal177@gmail.com
Elias PEDRO	CEDES	Coord. Proyectos	+258 84 241 5990	eliascedes@gmail.com
Maxime ZABRODIN	OIT/ILO	Proj. Assistant	+258 84 592 9766	zabrodin@iloguest.org
Diquisson DOS MUCHANGOS	CRS/CARITAS/CHEMO	Engenhero Projecto	847320497	dosmuchangoseengenharia@gmail.com

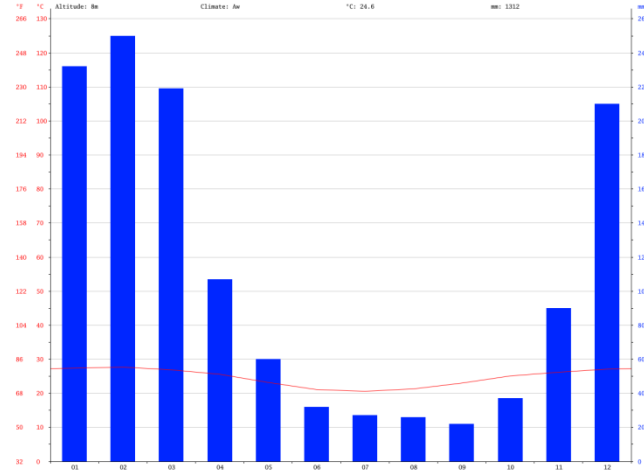
